



Результаты мониторинга реализации
государственных программ
Республики Коми
за I-III квартал 2018 года

Министерство экономики Республики Коми
Ноябрь 2018

Перечень госпрограмм Республики Коми, действующих в 2018 году

Инновационное развитие и модернизация экономики

Новое качество жизни

Наименование госпрограммы Республики Коми	Сокращенное наименование
Развитие здравоохранения	Здравоохранение
Развитие образования	Образование
Социальная защита населения	Социальная защита
Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности	Строительство
Содействие занятости населения	Занятость
Защита населения и территории Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	ГО и ЧС
Развитие культуры и туризма в Республике Коми	Культура и туризм
Развитие физической культуры и спорта	Спорт
Современная городская среда на территории Республики Коми	Городская среда


Наименование госпрограммы Республики Коми	Сокращенное наименование
Развитие экономики	Экономика
Развитие промышленности	Промышленность
Информационное общество	Информационное общество
Развитие транспортной системы	Транспорт
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми	Сельское хозяйство
Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды	Природные ресурсы
Развитие лесного хозяйства	Лесное хозяйство

Эффективное государственное управление


Наименование госпрограммы Республики Коми	Сокращенное наименование
Управление государственным имуществом Республики Коми	Государственное имущество
Управление государственными финансами и государственным долгом	Государственные финансы
Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми	Юстиция и правопорядок
Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018 - 2020 годы	Оказание содействия добровольному переселению

Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми на 2018 год

840 контрольных событий

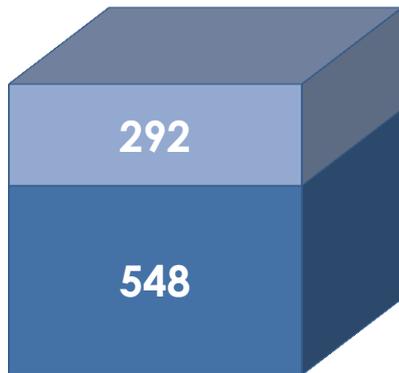


- Текущие контрольные события
- Наиболее важные контрольные события

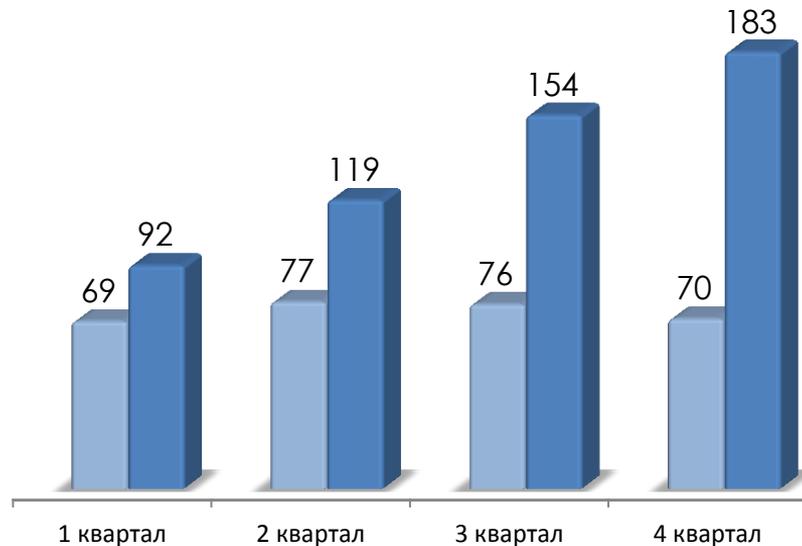

Выполнение контрольных событий госпрограмм Республики Коми за I-III квартал 2018 года

Выполнение наиболее важных контрольных событий (КС)*

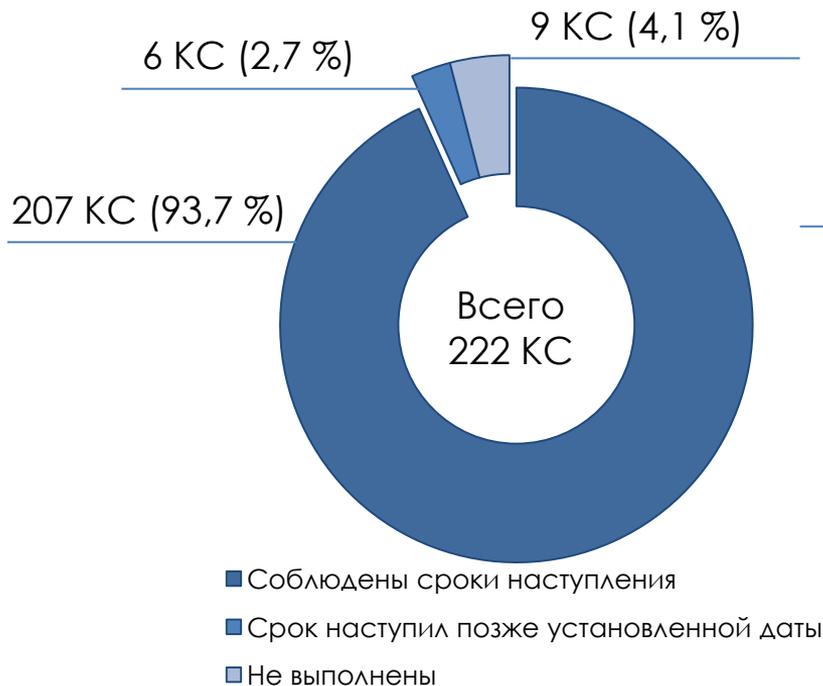

Выполнение текущих контрольных событий (КС)




*Информация о результатах мониторинга реализации госпрограмм Республики Коми (на основе наиболее важных контрольных событий) за I-III квартал 2018 года в Приложении


Степень достижения наиболее важных контрольных событий госпрограмм Республики Коми за I-III квартал 2018 года

93 %

Степень достижения
(в среднем)

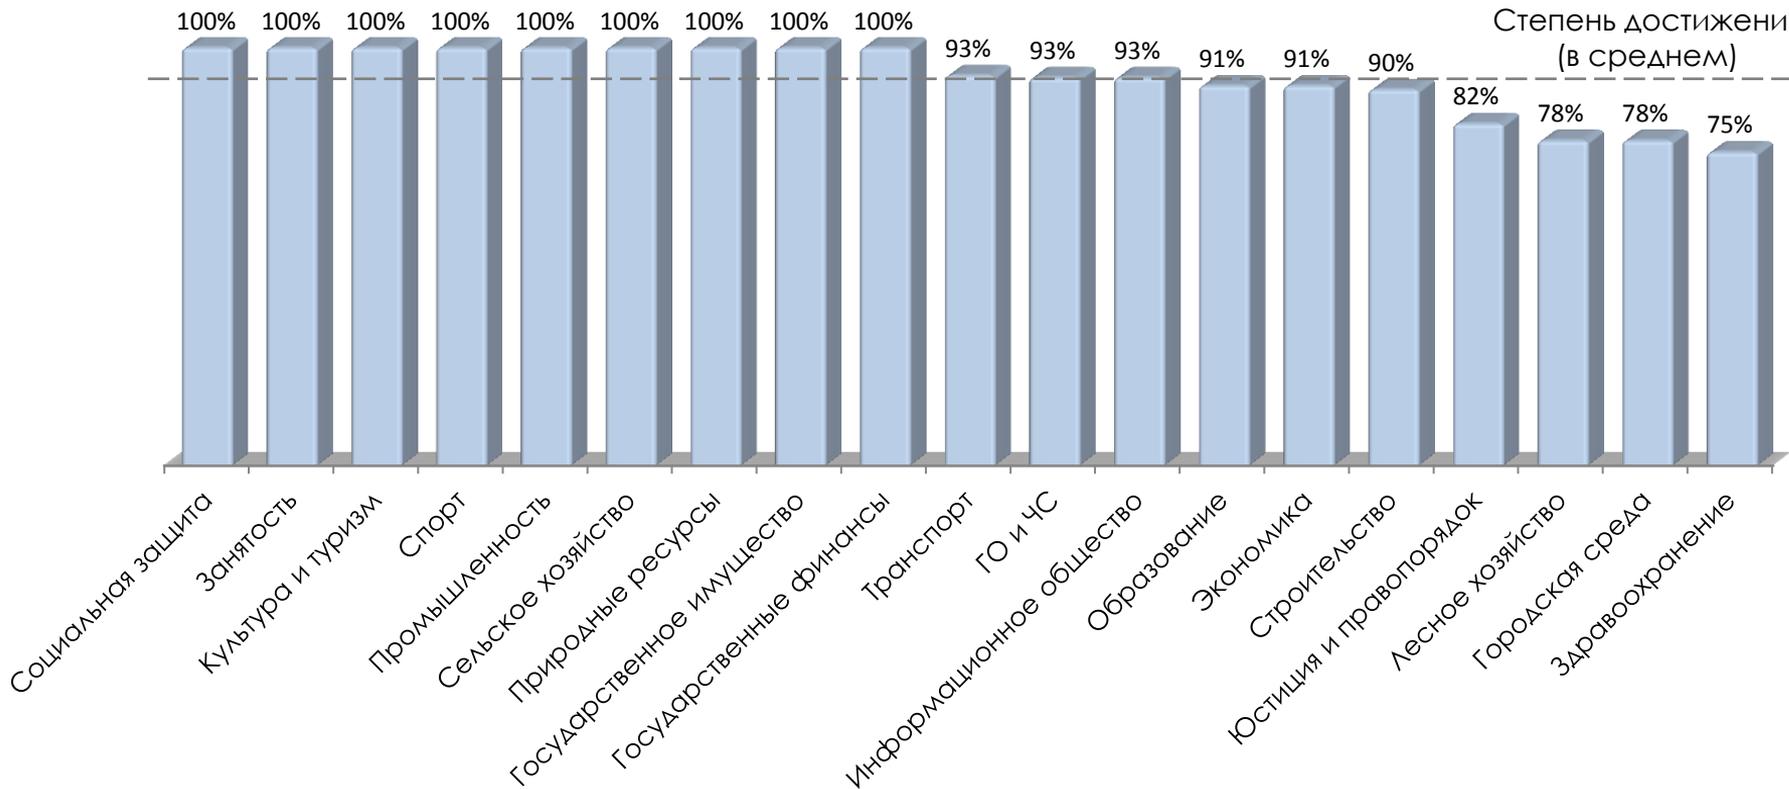

Степень достижения текущих контрольных событий госпрограмм Республики Коми за I-III квартал 2018 года

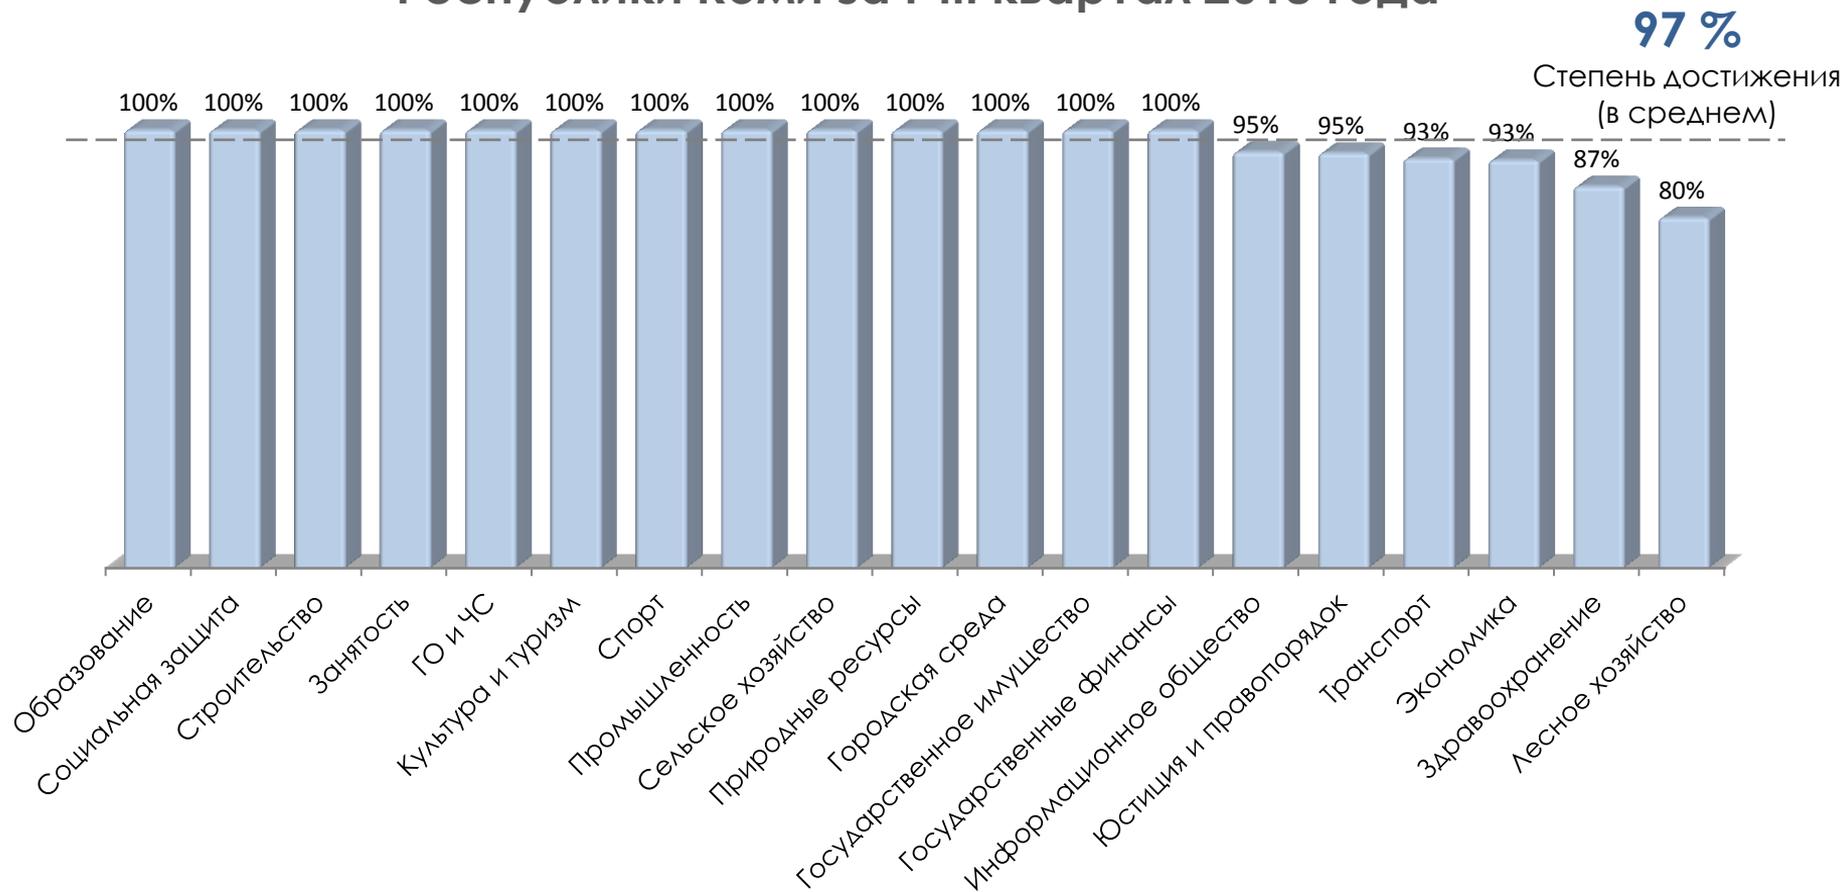

Невыполненные (выполненные с нарушением срока) наиболее важные контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения в срок*



Здравоохранение

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: срок подготовки приказа МЗ РК «О централизованных закупках в 2018 году» перенесен в связи с уточнением перечня оборудования, планируемого к закупке).
2 КС не выполнены (причина: 1) Работы по проведению ремонтно-строительных работ в соответствии с проектно-сметной документацией в ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер» в I полугодии 2018 года не выполнены, ввиду проверки и устранения замечаний проектно-сметной документация в Госэкспертизе; 2) Неправильное планирование контрольного события. Отчет о деятельности коек сестринского ухода медицинских организаций Республики Коми не подготовлен в связи с тем, что указанная отчетность с 2018 года отменена.).



Образование

1 КС не выполнено (причина: в связи с неисполнением подрядчика (ООО "Белстройцентр-Калуга") обязательств по строительству объекта "Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре Республики Коми" контракт расторгнут в одностороннем порядке. В настоящее время работы на объекте не ведутся. После проведения повторной экспертизы проектно-сметной документации планируется проведение конкурсной процедуры по определению подрядчика с вводом объекта в эксплуатацию в срок до 31 июля 2019 года.).



Строительство

1 КС не выполнено (причина: контрольное событие не выполнено, в связи с поздним распределением средств республиканского бюджета Республики Коми на 2018 год на предоставление социальных выплат (распоряжение от 20.09.2018 г.), связанным с длительным процессом подготовки данного распоряжения и его рассмотрения. В связи с чем только после 20.09.2018 организована работа органами местного самоуправления с гражданами по предоставлению в Минстрой Республики Коми пакетов документов для предоставления социальных выплат. Предполагаемая дата выполнения КС - первая половина декабря 2018 года.).



ГО и ЧС

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: причиной нарушения срока выполнения КС, запланированного на 1 квартал 2018 года, является несостоявшийся электронный аукцион на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению и тиражированию печатных материалов (плакаты, брошюры, методические рекомендации) на антитеррористическую тематику на 2018 год, в связи с чем контракт заключен 16 июля 2018 года.).

Невыполненные (выполненные с нарушением срока) наиболее важные контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения в срок*



Экономика

1 КС не выполнено (причина: с учетом масштабности и долговременного характера выполнения задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года (далее – Послание), подготовка проекта распоряжения Правительства РК на 2018 год по реализации основных положений Послания будет осуществлена после принятия федеральных документов во исполнение Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 15 марта 2018 года № Пр-436).



Информационное общество

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: затянувшийся конкурсный отбор на заключение государственного контракта на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2018 год. Государственный контракт заключен во 2 квартале 2018 года).

1 КС не выполнено (причина: в связи с планируемым изменением законодательства о транспортной безопасности (Приказа Минтранса России от 23.07.2014 г. №196 , далее – Приказ) в части критериев категорируемых объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, выполнение мероприятий по транспортной безопасности временно приостановлено до внесения соответствующих изменений (основание: Проект резолюции VIII Международного форума "Безопасность на транспорте", согласно которой предлагается внести изменения в подраздел "Дорожное хозяйство" Приказа в части расширения перечня объектов транспортной инфраструктуры и транспортной безопасности, не подлежащих категорированию по видам транспорта.))).



Транспорт

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: длительность процедуры подготовки и утверждения необходимых нормативных правовых актов. Соглашение заключено во 2 квартале 2018 года).

1 КС не выполнено (причина: по состоянию на 31.08.2018 г. работы по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по всем проектам благоустройства выполнены только на 80 % в связи с повторными заключениями контрактов, не выходом подрядчиков на торги, изменением условий контрактов. Выполнение КС предусматривается в IV квартале 2018 года.).



Городская среда

Невыполненные (выполненные с нарушением срока) наиболее важные контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения в срок*



Лесное хозяйство

1 КС выполнено с нарушением сроков (причина: контрольное событие выполнено с нарушением сроков по причине длительной процедуры регистрации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в системе ЕСИА (регистрация 14.02.2018г.), связанной с реорганизацией органов исполнительной власти Республики Коми (Указ Главы Республики Коми от 26.06.2017 г. №55), активации учетной записи организатора торгов на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (активация 06.03.2018г.)).

1 КС не выполнено (причина: государственные контракты на выполнение работ по воспроизводству лесов состоялись только в 12 государственных учреждениях (лесничествах) из 26. Выполнение работ по календарному плану в контрактах продлено до 20 ноября в связи с тем, что контракты по большей части были заключены только в сентябре 2018 года, 2 контракта на 01.10.2018 находились на стадии подписания. Выполнение контрольного события возможно в конце ноября 2018 года.



Юстиция и правопорядок

1 КС выполнено с нарушением сроков (причина: информация о ходе реализации антикоррупционных планов подведомственных учреждений за 2017 год рассмотрена 24 июля 2018 года, одновременного с информацией за 1 полугодие 2018 года (в соответствии с пунктом 2.1. протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми № 9 от 12.04.2018 г., руководителям органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных учреждений, необходимо обеспечить принятие правовых актов в целях противодействия коррупции в государственных учреждениях).

1 КС не выполнено (причина: длительность процедуры подготовки и утверждения проекта протокола согласования потребности в финансовых средствах на закупку материальных ценностей и оплату услуг, необходимых для реализации в 2019 году полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях. По данным МВД по Республике Коми проект Протокола будет рассмотрен ФЭД МВД России в IV квартале 2018 года с учетом статистики составленных в 2018 году протоколов материалов по административным нарушениям и с учетом остатков материальных запасов.).

Невыполненные (выполненные с нарушением срока) текущие контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения в срок



Здравоохранение

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: неправильное планирование даты наступления контрольного события (план профилактических мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний подготовлен 28 июня 2018 года в соответствии с поручением Министерства здравоохранения Российской Федерации (№ 17-9/10/2-3795 от 13.06.2018). Ранее реализовывался региональный план мероприятий по снижению смертности от новообразований на 2016-2018, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Республики Коми от 21.01.2015 № 79-р).

3 КС не выполнены (причины: 1. Освоение средств субсидии из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 1 октября 2018 года составило 38,9%. В настоящее время ведутся работы по заключению договоров; 2. Неправильное планирование контрольного события (контрольное событие по проведению не менее 50% запланированных работ по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь населению, не выполнено, в связи с отсутствием финансирования на 2018 год); 3. Неправильное планирование даты наступления контрольного события по проведению ремонта не менее 2 объектов здравоохранения (в ГУ РК «Кардиологический диспансер» проводятся работы по устройству выходных дверей, срок выполнения работ по контракту - до 04.12.2018 г. Проведение мероприятий по капитальному или текущему ремонту асфальто-бетонного покрытия на объектах здравоохранения запланировано на IV квартал 2018 г.)).

1 КС не выполнено (причина: проведение заседания комиссии по формированию тем научно-исследовательских работ на 2019 год перенесено на неопределенный срок в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Н.А. Михальченковой о реорганизации системы поддержки прикладных научных исследований по заказу органов исполнительной власти Республики Коми)

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: неправильное планирование даты наступления контрольного события).



Экономика



Информационное общество

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: для проведения аттестации по требованиям безопасности не менее 2 государственных информационных систем Республики Коми с учетом требований, установленных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, было необходимо выделение дополнительных средств с целью дооснащения центра обработки данных ГАУ РК «ЦИТ» дополнительными средствами защиты информации).

Невыполненные (выполненные с нарушением срока) текущие контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения в срок



Лесное хозяйство

1 КС не выполнено (причина: длительность процедуры подготовки и утверждения необходимых нормативных правовых актов, в связи с чем заключение контракта по разработке лесохозяйственного регламента перенесено на неопределенный срок).



Юстиция и правопорядок

1 КС не выполнено (причина: неправильное планирование даты наступления контрольного события (Мероприятие не исполнено, так как проведение межведомственного семинара, направленного на профилактику злоупотребления алкоголем, случайного отравления алкоголем, запланировано Министерством здравоохранения Республики Коми на 4 квартал 2018 года.);

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: длительность процедуры подготовки и утверждения необходимых нормативных правовых актов, в связи с чем План мероприятий по реализации Концепции обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми в 2018 году утвержден позже установленного срока).




Транспорт

2 КС выполнены с нарушением срока (причины: 1) день проведения совещания с ФБУ «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей» перенесен с ранее запланированной даты 28.09.2018г. на 01.10.2018г. в связи с возникшей производственной необходимостью участников совещания; 2) день проведения совещания с АО "Комиавиатранс" по вопросу приобретения дополнительной наземной техники и специального оборудования перенесен с ранее запланированной даты 28.09.2018г. на 02.10.2018г. в связи с возникшей производственной необходимостью участников совещания);

1 КС не выполнено(причина: в связи с планируемым изменением законодательства о транспортной безопасности (Приказа Минтранса России от 23.07.2014 г. №196 , далее – Приказ) в части критериев категоризируемых объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, выполнение мероприятий по транспортной безопасности временно приостановлено до внесения соответствующих изменений (основание: Проект резолюции VIII Международного форума "Безопасность на транспорте", согласно которой предлагается внести изменения в подраздел "Дорожное хозяйство" Приказа в части расширения перечня объектов транспортной инфраструктуры и транспортной безопасности, не подлежащих категорированию по видам транспорта.).

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми за I-III квартал 2018 года

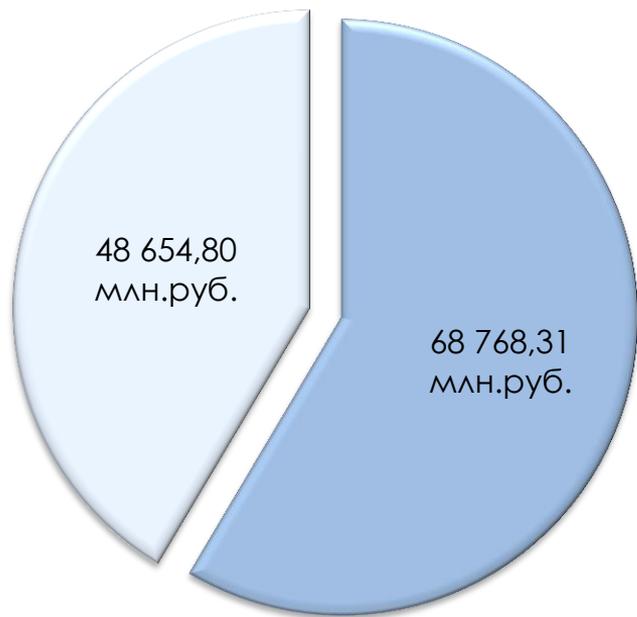

■ План на 2018 год

■ Кассовый расход за I-III квартал 2018 года

	План на 2018 г.*	Кассовый расход*
Здравоохранение	14 434,12	10 024,35
Образование	20 713,39	15 420,17
Социальная защита	10 880,56	7 765,80
Строительство	3 644,31	2 379,17
Занятость	596,23	396,77
ГО и ЧС	1 416,90	927,67
Культура и туризм	1 915,91	1 616,32
Спорт	575,28	456,24
Экономика	226,29	175,85
Промышленность	238,24	45,76
Информационное общество	1 172,62	861,37
Транспорт	4 573,30	2 835,52
Сельское хозяйство	1 375,44	994,29
Природные ресурсы	240,36	120,05
Лесное хозяйство	747,84	507,38
Государственное имущество	204,95	106,82
Государственные финансы	5 103,01	3 577,31
Юстиция и правопорядок	453,42	281,88
Городская среда	256,13	162,10

млн. руб.

*Данные системы АЦК-Финансы (параметры: Смета, ПНО) по состоянию на 1 октября 2018 года.

Степень освоения средств республиканского бюджета Республики Коми за I-III квартал 2018 года к плану на 2018 год

