

Результаты мониторинга реализации  
государственных программ  
Республики Коми  
за 1 полугодие 2019 года

Министерство экономики Республики Коми  
Август 2019

# Перечень госпрограмм Республики Коми, действующих в 2019 году

## Новое качество жизни

Наименование госпрограммы Республики Коми	Сокращенное наименование
Развитие здравоохранения	Здравоохранение
Развитие образования	Образование
Социальная защита населения	Социальная защита
Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности	Строительство
Содействие занятости населения	Занятость
Защита населения и территории Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	ГО и ЧС
Развитие культуры и туризма в Республике Коми	Культура и туризм
Развитие физической культуры и спорта	Спорт
Современная городская среда на территории Республики Коми	Городская среда

## Инновационное развитие и модернизация экономики


Наименование госпрограммы Республики Коми	Сокращенное наименование
Развитие экономики	Экономика
Развитие промышленности	Промышленность
Информационное общество	Информационное общество
Развитие транспортной системы	Транспорт
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми	Сельское хозяйство
Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды	Природные ресурсы
Развитие лесного хозяйства	Лесное хозяйство

## Эффективное государственное управление


Наименование госпрограммы Республики Коми	Сокращенное наименование
Управление государственным имуществом Республики Коми	Государственное имущество
Управление государственными финансами и государственным долгом	Государственные финансы
Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми	Юстиция и правопорядок
Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018 - 2020 годы	Переселение соотечественников

# Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми на 2019 год

846 контрольных событий\*

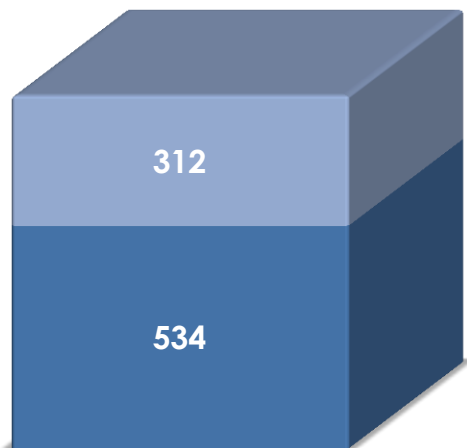


- Наиболее важные контрольные события
- Текущие контрольные события

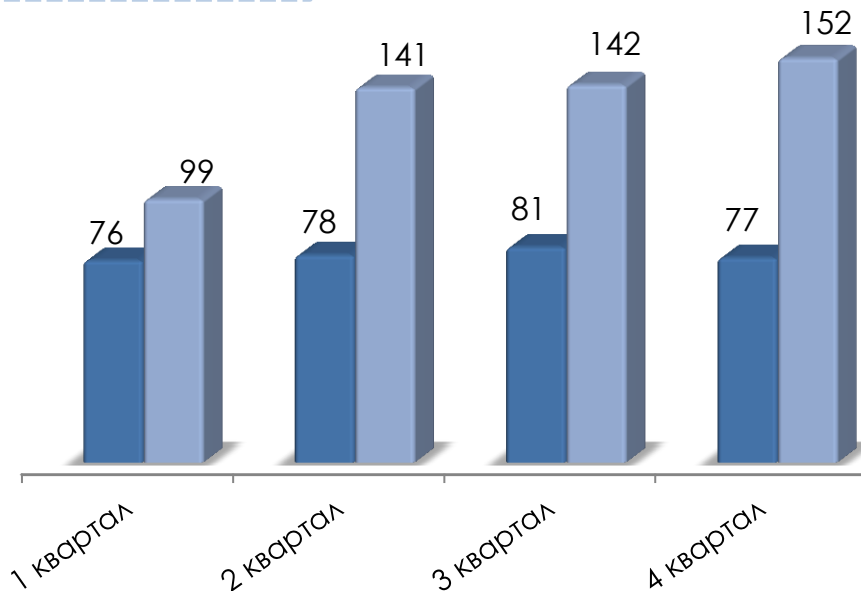


# Выполнение контрольных событий госпрограмм Республики Коми за 1 полугодие 2019 года

Выполнение наиболее важных контрольных событий (КС)\*

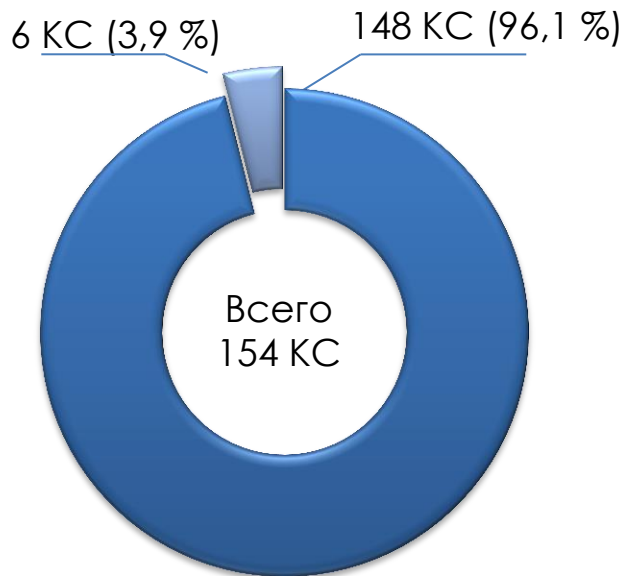

- Соблюдены сроки наступления событий
- События, не наступившие в установленный срок

Выполнение текущих контрольных событий (КС)

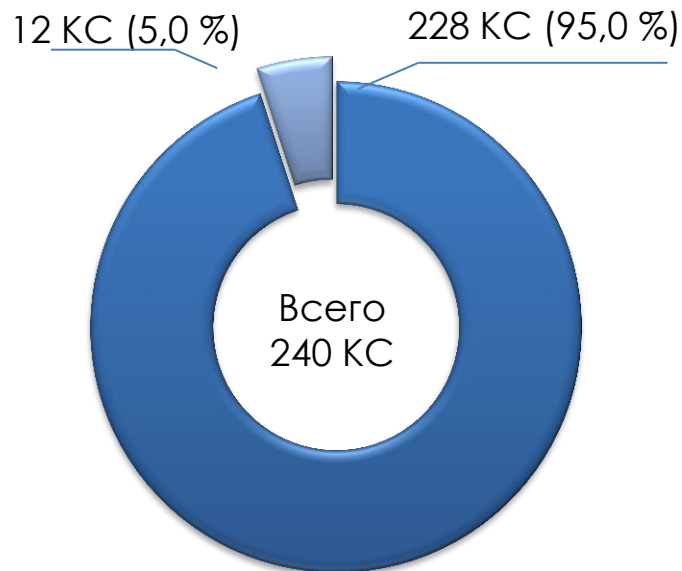


- Соблюдены сроки наступления событий
- События, не наступившие в установленный срок

\* Информация о результатах мониторинга реализации госпрограмм Республики Коми (на основе наиболее важных контрольных событий) за 1 полугодие 2019 года в Приложении.


# Степень достижения наиболее важных контрольных событий госпрограмм Республики Коми за 1 полугодие 2019 года

96 %

Степень достижения  
(в среднем)

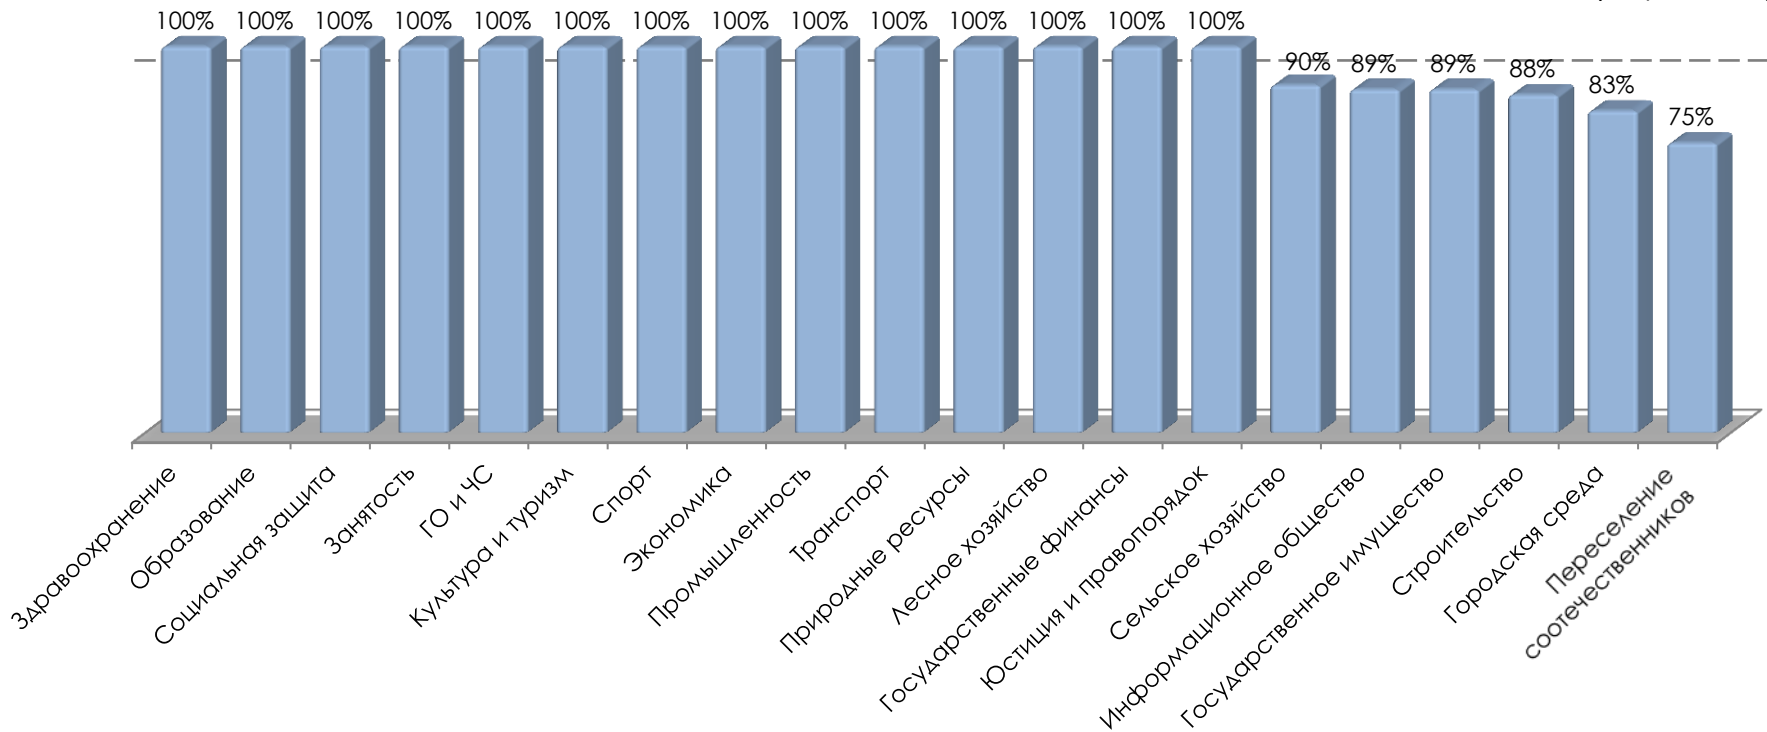

# Степень достижения текущих контрольных событий госпрограмм Республики Коми за 1 полугодие 2019 года

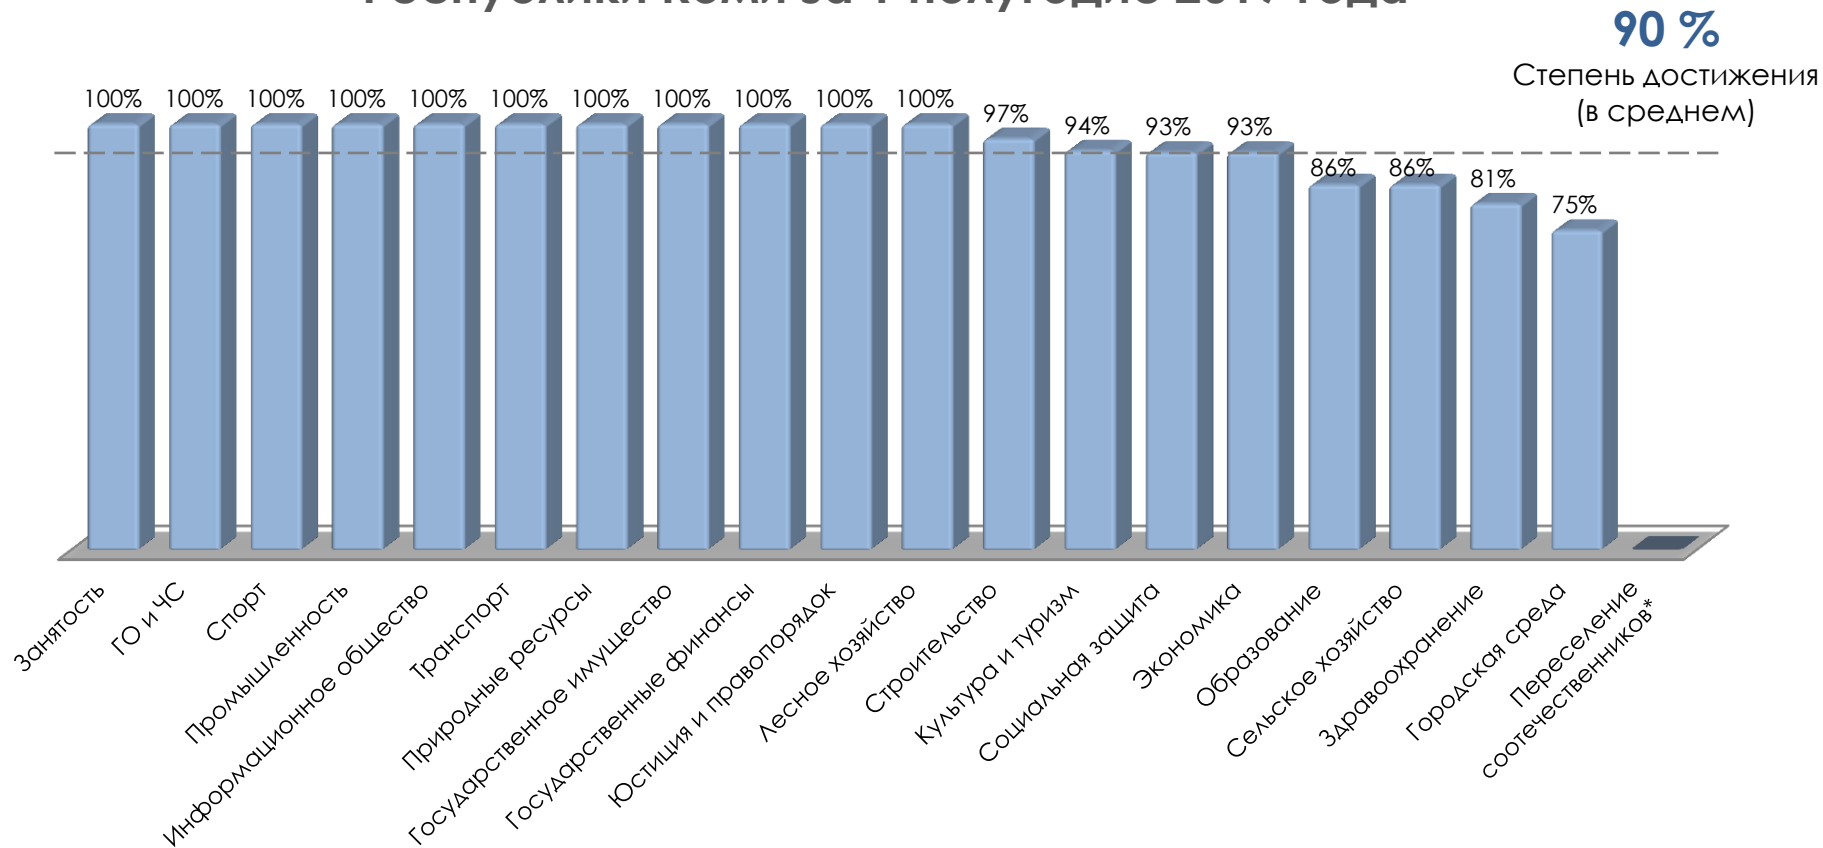

\* Текущие КС не запланированы. Госпрограмма содержит всего 8 основных мероприятий, все 8 КС, запланированных на 2019 год, являются наиболее важными.

# Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения

## Наиболее важные контрольные события (КС)\*



### Информационное общество

**1 КС выполнено с нарушением срока** (причина: договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники по состоянию на 30 марта 2019 г. не заключены по причине отсутствия разработанных и утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации требований к типовому АРМ госслужащего (в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление»). В 1 квартале 2019 года проведены мероприятия по определению импортозамещённого программного обеспечения и операционной системы.).



### Сельское хозяйство

**1 КС выполнено с нарушением срока** (причина: в первом квартале 2019 года подготовлен проект приказа о распределении субвенций федерального бюджета. Проектом приказа предусматривалось распределение субвенций по нескольким направлениям. В ходе подготовки Технического задания возникла необходимость в рассмотрении возможности направления части средств на проведение мероприятий по другим направлениям. Мероприятия, на выполнение которых направляются средства ФБ, определены, согласованы и утверждены приказом от 17.04.2019 № 411.).



### Строительство

**1 КС выполнено с нарушением срока** (причина: задержка срока исполнения контрольного события обусловлена длительностью процедуры подготовки и согласования проекта распоряжения Правительства Республики Коми «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми к работе в зимних условиях 2019-2020 года».).

# Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения

## Наиболее важные контрольные события (КС)\*



### Государственное имущество

**1 КС выполнено с нарушением срока** (причина: документация для заключения госконтрактов, договоров на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости была подготовлена к марту 2019 года. ГКУ РК «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми» данная документация принята в работу после доведения лимитов в апреле 2019 года. Далее необходимыми процедурами занимается ГКУ РК «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми». В июне 2019 года состоялся открытый аукцион в электронном виде (госконтракт заключен 8 июля 2019 года).



### Городская среда

**1 КС выполнено с нарушением срока** (причина: контрольное событие выполнено с нарушением срока в связи с затянувшимся заключением соглашений на бумажном носителе, а также в связи с разработкой мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и включением их в муниципальные программы, что является одним из условий заключения соглашений).



### Переселение соотечественников

**1 КС не выполнено** (причина: мониторинг уровня обеспеченности трудовыми ресурсами МО Республики Коми - территорий вселения за первое полугодие 2019 года проведен, информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 28.06.2019. На портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники» (далее – АИС) информация не размещена в связи с отсутствием технической возможности получения от Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации новых записей пользователей АИС. Информацию в АИС планируется разместить до конца 3 квартала 2019 года при наличии соответствующей технической возможности.).



# Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения

## Текущие контрольные события (КС)



### Здравоохранение

**2 КС не выполнены: «Контрольное событие № 49. Проведено не менее 50% запланированных работ по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь населению за 6 месяцев 2019 года»; «Контрольное событие № 97. Проведено не менее 30% запланированных работ по укреплению материально-технической базы учреждений службы крови за 1 полугодие 2019 года»**

(причина: мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь населению, и учреждений службы крови осуществляются при условии наличия финансирования из республиканского и федерального бюджетов. В 1 полугодии 2019 года средств по данному мероприятию не предусмотрено. Закупка оборудования и проведение ремонтных работ осуществляются учреждениями за счет внебюджетных источников);

**1 КС выполнено с нарушением срока: «Контрольное событие № 124. Проведено не менее 1 регионального совещания (конференции) по вопросам развития технологий медицинской реабилитации в 2019 году»** (причина: Министерством здравоохранения Республики Коми проведение мероприятия было запланировано в срок до 1 июня 2019 года, аналогично мероприятиям 2018 года. Сроки проведения совещания в 2019 году были перенесены ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России).

# Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения

## Текущие контрольные события (КС)



### Социальная защита

2 КС не выполнены: «Контрольное событие № 155 Информация об итогах проведения в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания представлена в Правительство Республики Коми»; «Контрольное событие № 158 Информация об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по результатам проведения в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания представлена в Правительство Республики Коми» (причина: информация об итогах проведения на территории Республики Коми независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания (далее – независимая оценка) в 2018 году доведена до заместителя Председателя Правительства Республики Коми Н.А. Михальченковой. Результаты независимой оценки рассмотрены на совещании в режиме видеоконференцсвязи с участием муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми. Вместе с тем, в связи с длительной доработкой сайта [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) Федеральным казначейством, ввод данных по результатам независимой оценки за 2018 год в систему стал возможным только в начале июня 2019 года. В настоящее время при вводе информации в обновленную систему возникают технические проблемы, вследствие чего субъектами Российской Федерации ввод данных в систему за 2018 год не завершен. Учитывая изложенное, представить комплексную информацию по результатам независимой оценки, проведенной на территории Республики Коми в 2018 году, в сравнении с субъектами Российской Федерации не представляется возможным. Планируемая дата исполнения контрольных событий – октябрь 2019 года.).

# Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения

## Текущие контрольные события (КС)\*



### Культура и туризм

1КС выполнено с нарушением срока: «Контрольное событие № 12 **Заключены соглашения на предоставление субсидии на выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры не менее чем в 10 муниципальных образованиях в 2019 г.**» (причина: в связи с задержкой подписания соглашений о предоставлении субсидий на выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры со стороны муниципальных образований).



### Экономика

1КС не выполнено: «Контрольное событие № 33 **Проведено 2 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми по подведению промежуточных итогов внедрения в Республике Коми целевых моделей в 2018-2019 годах**» (причина: неправильное планирование даты наступления контрольного события (в соответствии с Планом работы Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми за 2019 год, утвержденным 9 января 2019 года Главой РК С.А. Гапликовым, заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми по подведению промежуточных итогов внедрения в Республике Коми целевых моделей в 2018-2019 годах, предусмотрены в апреле и августе 2019 года).



### Городская среда

1КС выполнено с нарушением срока: «Контрольное событие № 18 **Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в 2019 году заключены**» (причина: соглашения с 85 МО о предоставлении субсидий на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в 2019 году заключены. Контрольное событие не выполнено в срок в связи с затянувшимся заключением соглашений на бумажном носителе, а также в связи с разработкой мероприятий, в целях финансирования которых предоставляется субсидия, и включением их в муниципальные программы, что является одним из условий заключения соглашений.).

# Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения

## Текущие контрольные события (КС)\*



### Сельское хозяйство

2КС выполнены с нарушением сроков:

- **«Контрольное событие № 50** Заключено соглашение с Минсельхозом РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2019 году республиканскому бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий регионального проекта **«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»** (причина: заключение соглашений осуществляется в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с запланированными на федеральном уровне сроками (ожидаемый срок - апрель 2019 г.). Проект соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2019 году республиканскому бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» от Минсельхоза России поступил на подпись в мае 2019 года. Заключено соглашение от 16.05.2019 № 082-17-2019-086);
- **«Контрольное событие № 108** **Утвержден план диспансеризации сельскохозяйственных животных в 2019 году»** (причина: неправильное планирование даты наступления контрольного события (разработан и утвержден план мероприятий по профилактике незаразных болезней крупного рогатого скота (Приказ от 25.06.2019 № 744).




### Образование

1КС выполнено с нарушением срока: **«Контрольное событие № 22** **Проведен Республиканский конкурс детского творчества «Зеркало природы» в 2019 году»** (причина: неправильное планирование даты наступления контрольного события).

# Госпрограммы Республики Коми, приведенные в соответствие с законом о республиканском бюджете Республики Коми с нарушением сроков

Срок приведения госпрограмм Республики Коми в соответствие с Законом о республиканском бюджете Республики Коми в 2019 году – **до 31 марта**

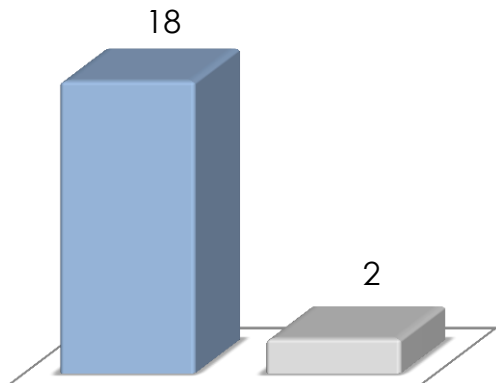

■ Госпрограммы Республики Коми без нарушения сроков

■ Госпрограммы Республики Коми с нарушением сроков




Культура и туризм  
– утверждение **09 апреля 2018 года**



Оказание содействия  
добровольному переселению  
– по состоянию на **30.06.2019**  
**постановление не утверждено**

# Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми за 1 полугодие 2019 года

План на 2019 год –  
79 621,22 млн.руб.

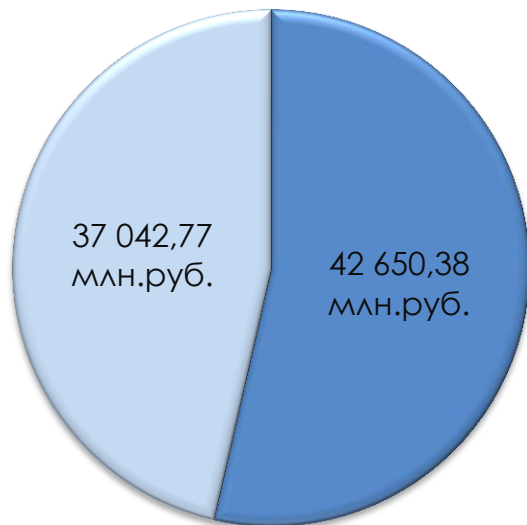

- План на 2019 год (остаток)
- Кассовый расход за 1 полугодие 2019 года

	План на 2019 г.*	Кассовый расход*
Здравоохранение	16 470,54	7 786,97
Образование	23 000,74	12 373,56
Социальная защита	12 034,25	5 386,78
Строительство	4 554,08	1 646,78
Занятость	797,51	367,39
ГО и ЧС	1 429,58	675,18
Культура и туризм	2 151,52	1 131,16
Спорт	911,74	311,44
Экономика	554,85	201,19
Промышленность	172,20	30,73
Информационное общество	1 371,09	614,97
Транспорт	6 401,19	2 536,31
Сельское хозяйство	1 633,97	673,17
Природные ресурсы	255,50	88,93
Лесное хозяйство	875,61	364,25
Государственное имущество	334,48	71,93
Государственные финансы	5 525,67	2 566,24
Юстиция и правопорядок	465,21	200,85
Городская среда	680,41	14,92
Переселение соотечественников	1,10	0,00

\*Данные системы АЦК-Финансы по состоянию на 1 июля 2019 года.

# Степень освоения средств республиканского бюджета Республики Коми в 1 полугодии 2019 года к плану на 2019 год

